

# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業の進捗状況について

施設整備課

## 1. 政策等の背景・目的及び効果

禁野小学校新校舎整備事業は、旧高陵小学校と旧中宮北小学校の学校統合に伴い、新校舎を建設するものであり、令和4年（2022年）6月10日に前田組・浦辺設計共同企業体（JV）と契約締結し、設計施工一括型デザインビルド（DB）方式により事業を進めており、現在、令和8年（2026年）8月からの新校舎での開校に向けて工事を進めているところです。

この度、受注者より2回目のインフレスライドの請求や、その他内容に変更が生じたので現時点の進捗状況とあわせて報告するものです。

## 2. 内 容

- 1) 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業（資料1）
- 2) 主な内容変更について（資料2）
- 3) 工事の進捗状況について（資料3）

### 3. 実施時期等

#### (1) これまでの経緯

##### 令和4年(2022年)

- 6月10日 定例月議会にて議決後契約締結、基本設計・解体計画着手
- 9月8日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会（対象：高陵幼稚園他）
- 9月25日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会（対象：周辺住民等）
- 10月8日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会（対象：中宮第三団地C地区自治会）
- 12月1日 解体工事着手

##### 令和5年(2023年)

- 5月31日 解体工事完了
- 6月5日 教育子育て委員協議会へ報告（基本設計等）
- 6月7日 建設環境委員協議会へ報告（基本設計等）
- 6月9日 実施設計開始
- 7月9日 基本設計等にかかる説明会
- 9月29日 文化財本調査着手

##### 令和6年(2024年)

- 2月13日 文化財本調査完了
- 5月31日 実施設計完了
- 6月3日 教育子育て委員協議会へ報告（実施設計等）
- 6月5日 建設環境委員協議会へ報告（実施設計等）
- 6月16日 建設工事等にかかる説明会
- 6月19日 インプレスライド請求（1回目）

7月 1日 新校舎建設工事着手  
11月27日 建設環境委員協議会に報告（インフレスライド等）  
令和7年（2025年）  
3月 6日 定例会議会にて議決後変更契約締結  
4月18日 インフレスライド請求（2回目）

（2）今後の取組（予定）

令和7年（2025年）

8月 建設環境委員協議会に報告  
9月 定例会議会においてインフレスライド（2回目）等の補正予算を提出  
12月 定例会議会において本整備事業の変更契約案件を提出

令和8年（2026年）

7月 新校舎建設工事完了  
8月 新校舎開校（2学期から授業開始）

## 4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画 基本目標 安全で、利便性の高いまち  
施策目標 2 災害時に、迅速・的確に対応できるまち  
基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち  
施策目標 11 すべての人がお互いに人権を尊重しあうまち  
基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち  
施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち  
施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち



## 5. 関係法令・条例等

地方教育行政の組織及び運営に関する法律  
学校教育法施行規則  
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令  
枚方市立小学校及び中学校設置条例  
小学校施設整備指針  
枚方市のめざす学校像  
禁野小学校における「新しい学校づくり」

## 6. 事業費・財源及びコスト

《事業費》	設計・工事費	3,966,611千円
《財 源》	国庫補助金	1,282,826千円
	(内訳)	
	(学校施設環境改善交付金 (文部科学省) :	16,316千円)
	(公立学校施設整備費負担金 (文部科学省) :	1,266,510千円)

1) 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【事業概要】

○事業概要

- (事業内容) 旧高陵小学校の校舎を全て解体し、その跡地に禁野小学校の新校舎を建設する。
- (事業手法) 設計施工一括型デザインビルド (DB) 方式
- (工期) 令和4年6月10日～令和8年7月15日  
(令和8年8月新校舎開校)
- (事業者) 前田組・浦辺設計共同企業体 (JV)
- (事業費) 3,966,611 千円 (当初 3,385,800 千円)
- (国庫補助金) 1,282,826 千円



○スケジュール等

	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	計
設計 工事 文化財調査	6月 基本設計	6月 実施設計	5月	新校舎建設工事		
	旧高陵小学校校舎解体工事		7月		7月	
	試掘	12月	5月 9月 本調査	※現時点のスケジュールであり、現場状況等により変更となる場合がある。		
年度毎 事業費	80,660 千円	189,374 千円	706,140 千円	2,334,080 千円	656,357 千円	3,966,611 千円
内 国庫補助金	—	—	302,999 千円	979,827 千円	—	1,282,826 千円

補助金の変遷について (令和5年度: 563,000 千円 → 令和6年度: 1,282,826 千円)

内訳 令和5年度 学校施設環境改善交付金: 419,000 千円、公立学校施設整備費負担金: 144,000 千円 合計: 563,000 千円

令和6年度 学校施設環境改善交付金: 16,316 千円、公立学校施設整備費負担金: 1,266,510 千円 合計: 1,282,826 千円

## 2) 主な内容変更について


### ①DB事業におけるインフレスライドの適用

工期内の急激なインフレーションを根拠に、請負代金の変更を請求することができるインフレスライドについて、令和7年(2025年)4月に事業者から請求がありました。事業者とは現在、概ね5パーセントで協議を進めているところです。

#### 工期内の予期できない特別の事情による、急激なインフレ等に対応

工事請負契約書 第25条第6項 (インフレスライド条項)


6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の定めにかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

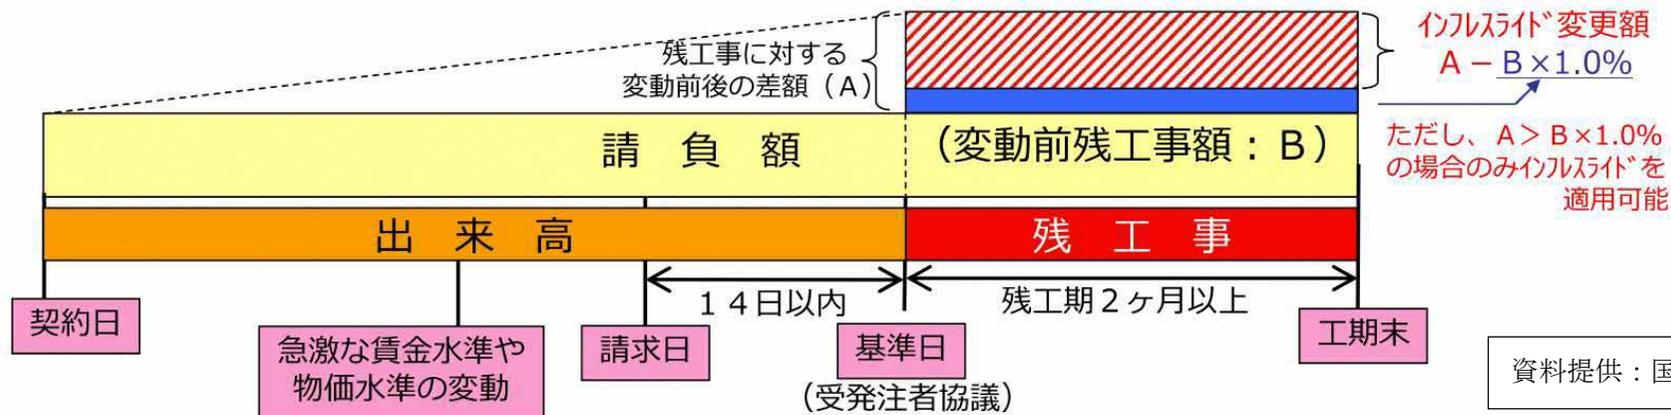

### ②その他の内容変更

敷地西側法面の排水施設等改修、冷媒ガスの仕様変更に伴う対策費、非常用発電機、地中障害物処分費の追加、残土の処分費減額について設計変更するものです。

### 3) 工事の進捗状況について

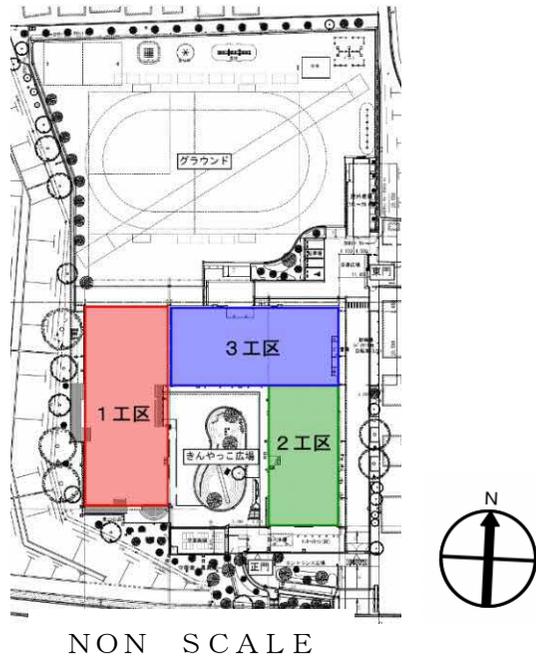

敷地全景写真  
令和7年度(2025年)  
5月末現在



1工区 内装工事中



2工区 体育館屋根鉄骨工事中



3工区 躯体コンクリート打設中
