



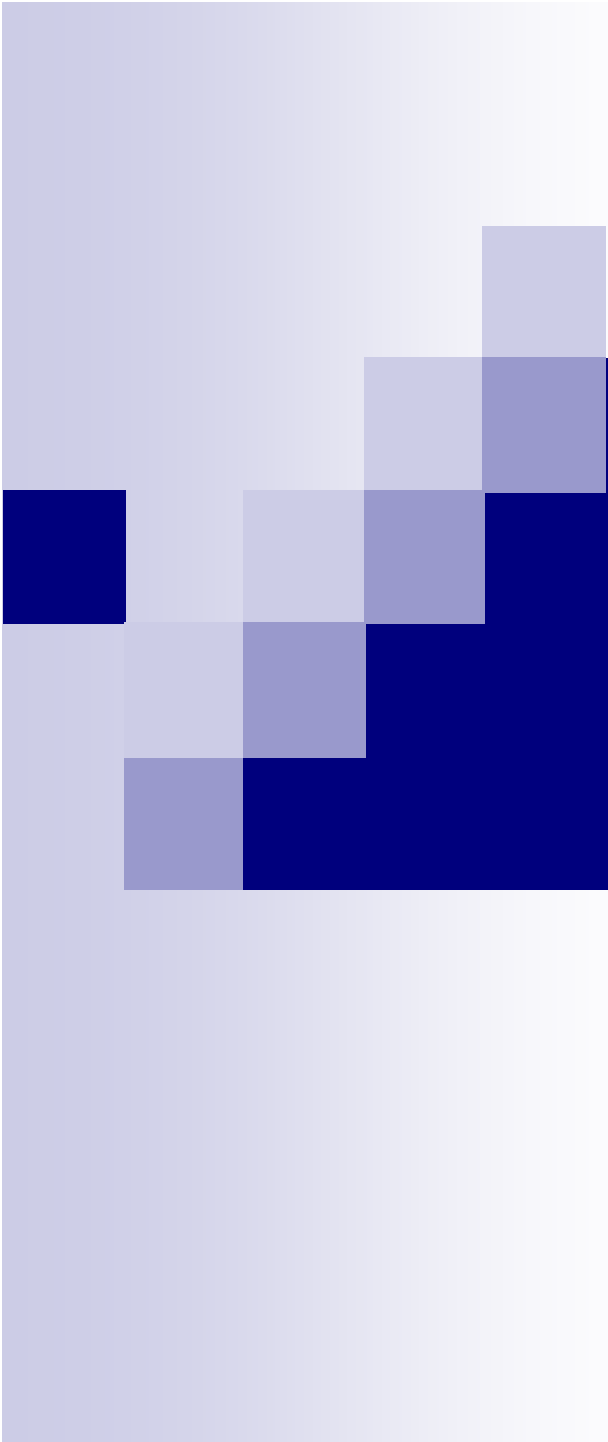

事務處理過程說明 資料




1. 枚方市における施設整備の

事務処理過程(概要)


2. 第2清掃工場建設工事に係る

事務処理過程(概要)


1. 枚方市における施設整備の事務処理過程(概要) ①事業計画期間

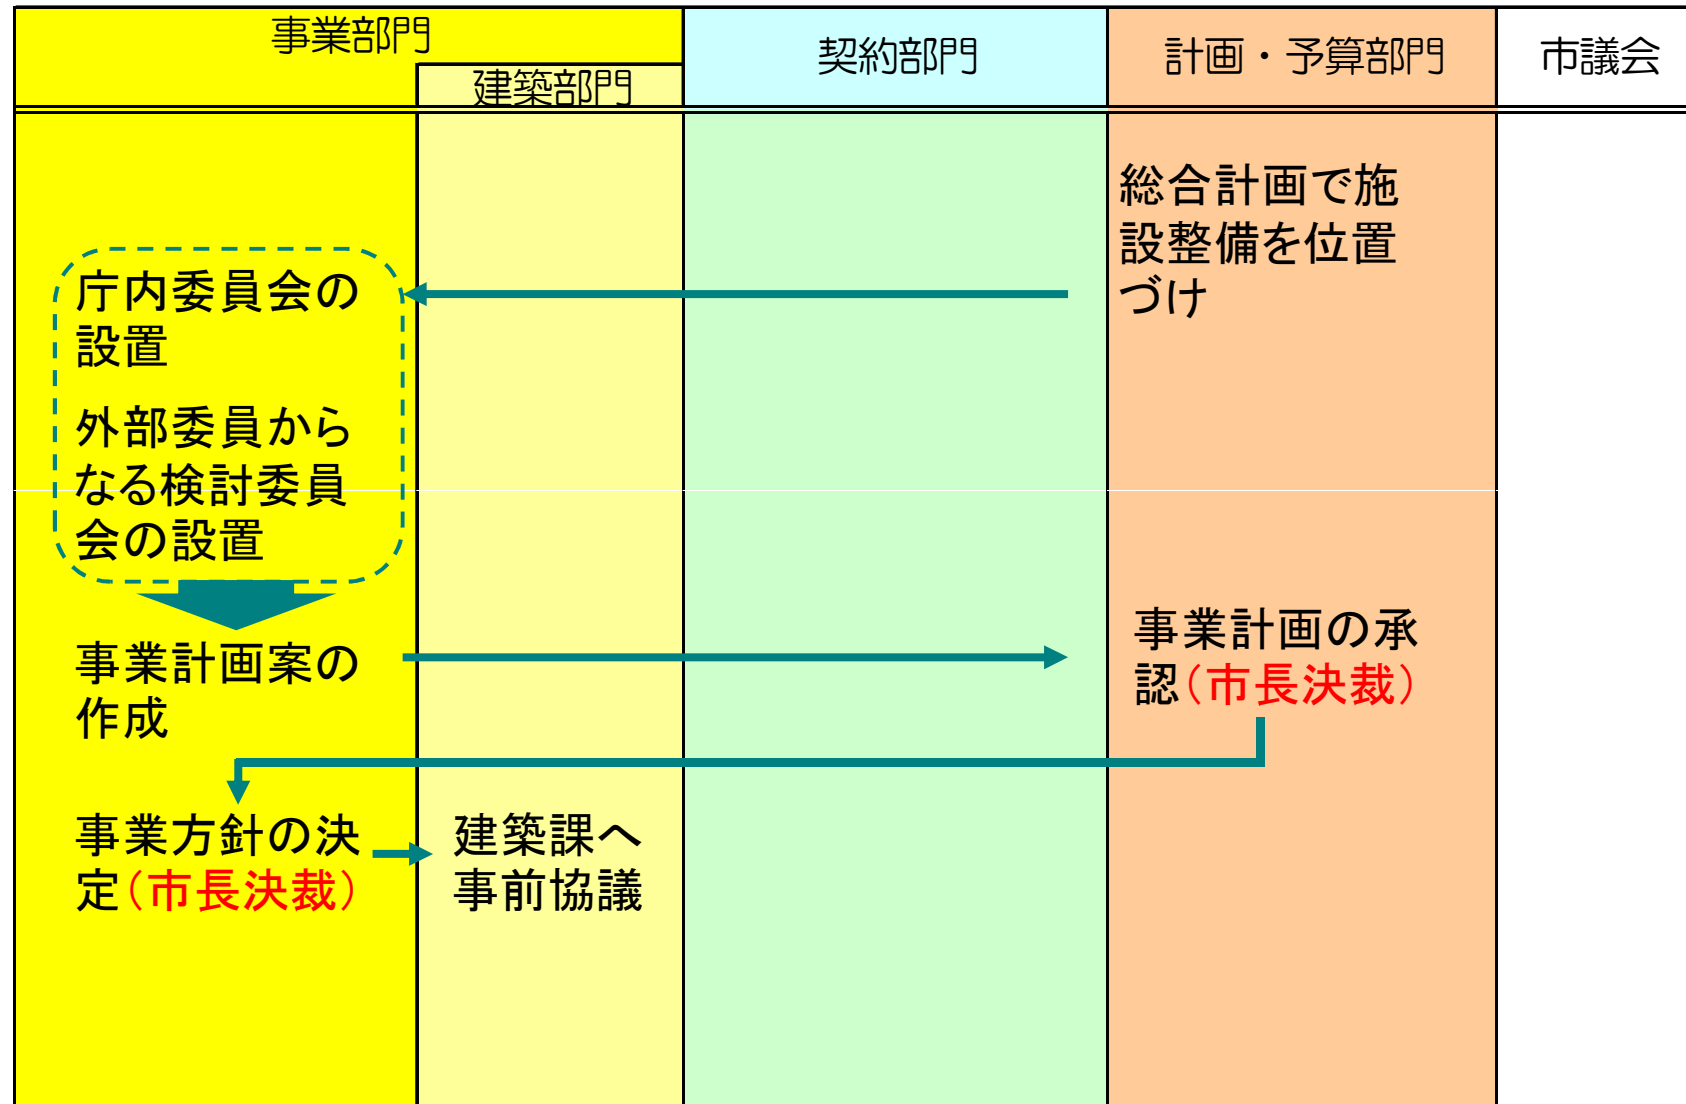

1. 枚方市における施設整備の事務処理過程(概要) ②契約準備期間

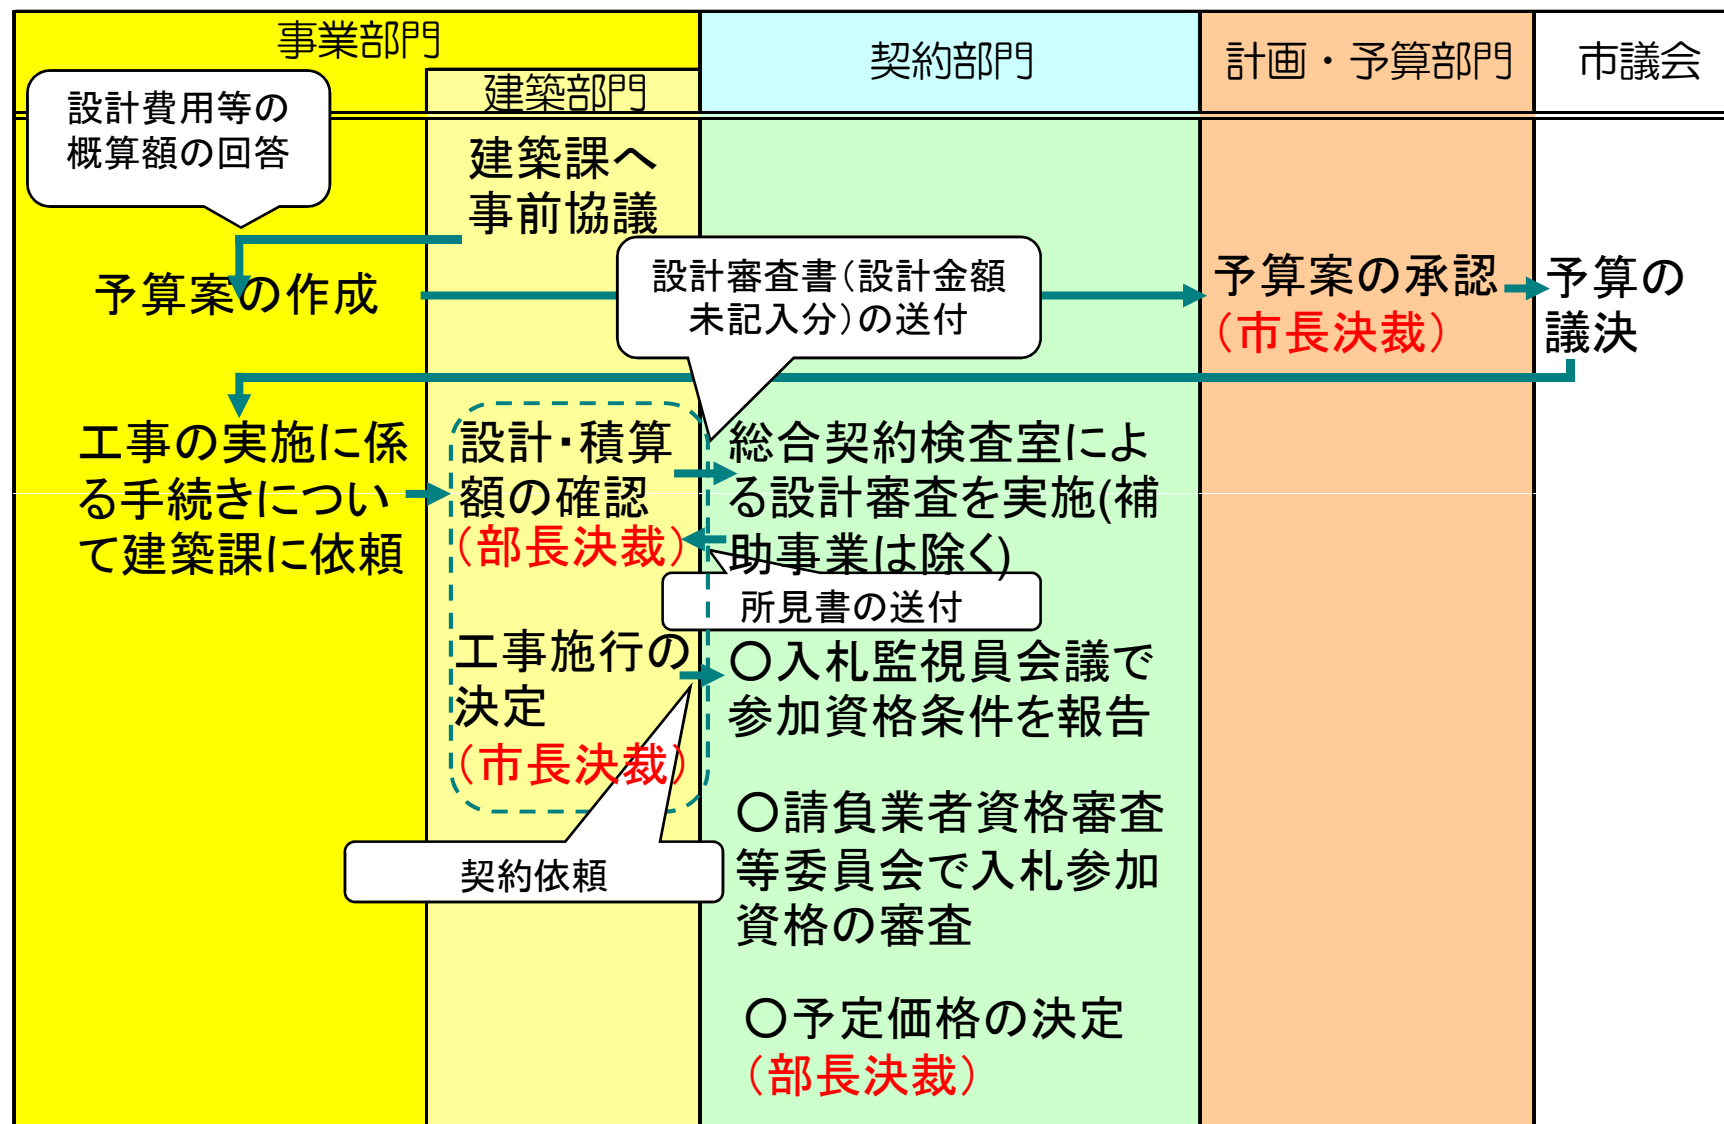

1. 枚方市における施設整備の事務処理過程(概要) ③契約期間

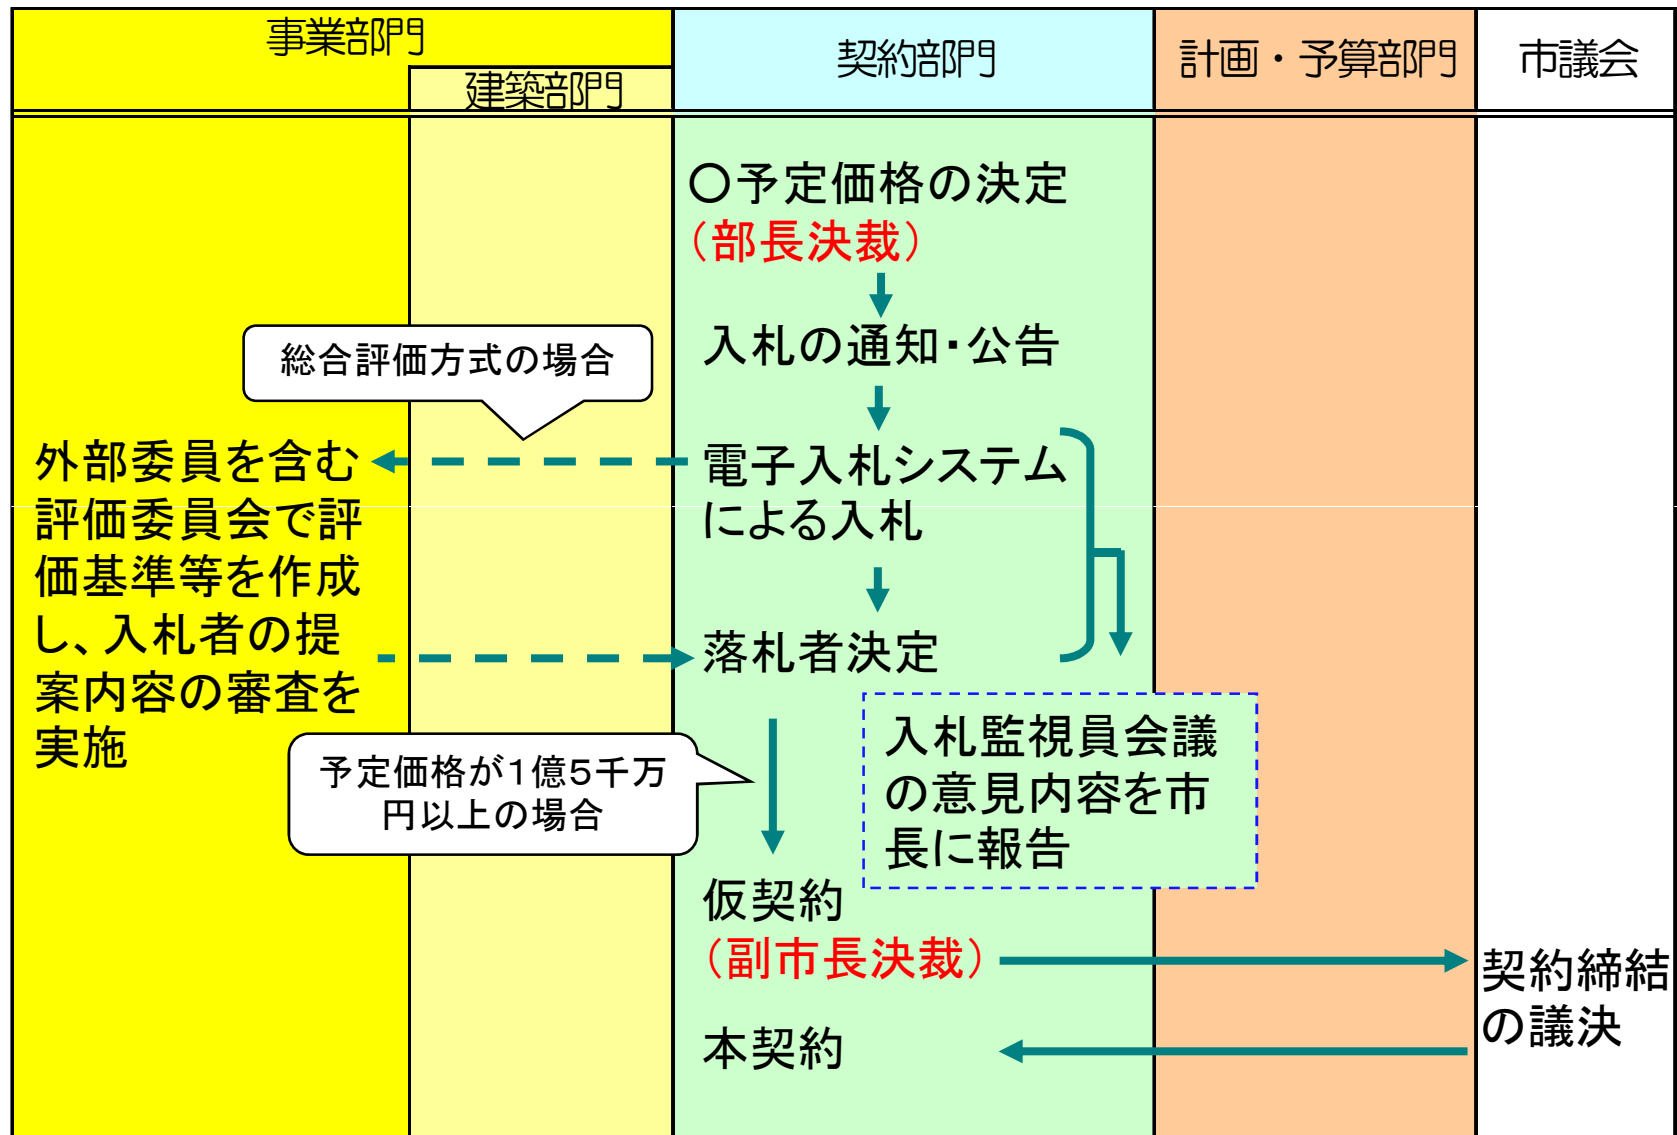

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ①事業計画期間

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
H13.3			第4次総合計画の 重点プランの中で 位置づけ	
H15.9.12	(仮称)第2清掃工場建設検討委員会(以下、「検討委員会」)で プラント設備工事 は総合評価指名競争入札、 建屋の建設工事 は制限付き一般競争入札とする分離発注方式の方針を決定			
10.10	事業計画案の作成			
10.16	分離発注の決定(市長決裁)			
H16.1.5	総合評価審査委員会(以下、「審査委員会」)設置			
1.20		入札監視員会議(以下、「監視員会議」)で、総合評価入札方式を報告		
1.29			事業計画の承認(市長決裁)	

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ②プラント契約準備期間

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
H16.1.29			事業計画の承認(市長決裁)	
2月			↓ 平成16年度当初予算案の承認 1億4,180万円(現計) 97億6,500万円(債務) 予算額計99億680万円	
3.26		○請負業者資格審査等委員会(以下、「請負審査委員会」)で、入札参加資格の審査		
3.29				平成16年度当初予算の議決
3月	設計・積算額の確認(部長決裁)	○予定価格の決定(部長決裁)	予定価格(税抜き) 59億2,346万2千円	
4.2	工事施行の決定(市長決裁)			

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ③プラント契約期間

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
H16.3.26		○予定価格の決定 (部長決裁)		
4. 2		↓ 監視員会議で、評価基準 及びスケジュール並びに 業者指名について報告		
6. 7	審査委員会で、各事 業者の提案の審査及 び評価を実施			
6.10		臨時に監視員会議を開 催(談合情報により) ※川崎重工業が落札	落札金額(税抜き) 55億円	
6.14		↓ 仮契約 (副市長決裁)		
6.17		川崎重工業とプラント設 備の本契約		契約締結 の議決

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ④予算組替期間

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
H16.9 9.24			<u>平成16年度9月補正予算案の承認</u> ▲1億5,682万円(債務) 予算額計97億4,998万円	9月補正予算の議決
H17.2 3.10			<u>平成16年度3月補正予算案の承認</u> ▲41億3,180万円(債務) ※同額を17年度当初予算に 現計3億9,768万8千円、 債務37億3,411万2千円で計上 <u>平成17年度当初予算案の承認</u> 13億1,877万6千円(現計) 82億8,940万4千円(債務)	3月補正予算議決
3.29				平成17年度当初予算議決

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ⑤建設工事契約 準備期間(1回目)

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
4.22	検討委員会で、工場棟・煙突と管理棟・洗車棟の建設工事の分割発注方針を決定			
7.1	分割発注の決定 (市長決裁)			
	設計・積算額の確認 (部長決裁)			
7.4		監視員会議で、工場棟及び煙突の建設工事発注案を報告		
7.8	工事施行の決定 (市長決裁)			
7.19		○請負審査委員会で、入札参加資格の審査 ○予定価格の決定 (部長決裁)		

予定価格(税抜き)
39億2,564万8千円

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ⑥建設工事契約期間 (1回目)

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
7.19		○予定価格の決定 (部長決裁)		
7.21		工場棟及び煙突の建設 工事に係る入札の公告 (1回目)		
8.8		入札中止(応札者がな かったため)		
8.10		監視員会議に、入札中止 を報告		
8.18		監視員会議で、今後の発 注方法の考え方を報告		
8.24	検討委員会で、工場 棟・煙突・管理棟・洗車 棟の一括発注方針を 決定			

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ⑦建設工事契約 準備期間(2回目)

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
8.24 8月	検討委員会で、工場棟・煙突・管理棟・洗車棟の一括発注方針を決定		9月補正予算案の承認 ▲1億6,802万9千円 (現計) 19億6,802万9千円 (債務) 予算額計 115億4,998万円	
9.12 9.22	一括発注の決定 (市長決裁)			9月補正予算の議決
9.29	設計・積算額の確認 (部長決裁)			
10. 5	工事施行の決定 (市長決裁)			

2. 第2清掃工場建設工事に係る事務処理過程(概要) ⑧建設工事契約期間 (2回目)

年月日	事業部門	契約部門	計画・予算部門	市議会
10. 5	工事施行の決定 (市長決裁)	監視員会議で、一括発注案を報告		
10.17		↓		
10.18		○請負審査委員会で、入札参加資格の審査		
		○予定価格の決定(部長決裁)	予定価格(税抜き) 56億4,896万6千円	
		↓		
10.20		工場棟・煙突・管理棟・洗車棟の建設工事に係る入札の公告(2回目)	落札金額(税抜き) 55億6,000万円	
		↓		
11.10		入札(開札の結果、大林・浅沼共同企業体が落札)		
		↓		
11.18		仮契約(副市長決裁)		
12. 5		大林・浅沼共同企業体と本契約		契約締結の議決
