

## 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業の進捗状況について

建築課

### 1. 政策等の背景・目的及び効果

禁野小学校新校舎整備事業は、旧高陵小学校と旧中宮北小学校の学校統合に伴い、新校舎を建設するものであり、令和4年（2022年）6月10日に前田組・浦辺設計共同企業体（JV）と契約締結し、設計施工一括型デザインビルド（DB）方式により事業を進めているところです。

この度、旧高陵小学校校舎の解体工事及び新校舎の基本設計のとりまとめが完了したことから、進捗状況等について報告するものです。

### 2. 内 容

別紙資料・・・枚方市立禁野小学校新校舎整備事業

### 3. 実施時期等

#### (1) 経緯

令和4年(2022年)

- 6月10日 定例会議会にて議決後契約締結、基本設計・解体計画着手
- 9月8日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会 開催  
(対象：高陵幼稚園、こうりょう小規模保育施設)
- 9月25日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会 開催  
(対象：周辺住民等)
- 10月8日 旧高陵小学校校舎解体工事説明会 開催  
(対象：中宮第三団地C地区自治会)
- 12月1日 解体工事着手

令和5年(2023年)

- 5月末日 解体工事完了(予定)

【上記については下記の関係者会議にて協議の上実施している】

会議名	頻度	会議員
新しい学校づくり協議会	毎月1回	禁野小学校PTA会長、高陵校区コミュニティ協議会会長、中宮北校区コミュニティ協議会会長、禁野小学校校長、本市関係課、JV
関係課会議	毎月1回	禁野小学校校長、本市関係課、JV
定例会議	毎月2回	本市関係課、JV

## (2) 今後の取組 (予定)

令和5年(2023年)

6月 教育子育て委員協議会・建設環境委員協議会に当事業の進捗状況を報告  
実施設計開始

7月 新校舎の基本設計内容にかかる説明会開催予定 (対象: 周辺住民等)

8月 文化財本調査開始

令和6年(2024年)

3月 文化財本調査完了 (状況により変更の可能性あり)

6月 実施設計完了  
新校舎建設工事着手

令和8年(2026年)

7月 新校舎建設工事完了

8月 夏休み中に新校舎に引越し、2学期から授業開始

## 4. 総合計画等における根拠・位置付け

総合計画 基本目標 安全で、利便性の高いまち

施策目標 2 災害時に、迅速・的確に対応できるまち

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち

施策目標 11 すべての人がお互いに人権を尊重しあうまち

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち



## 5. 関係法令・条例等

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

学校教育法施行規則

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

枚方市立小学校及び中学校設置条例

小学校施設整備指針

枚方市のめざす学校像

禁野小学校における「新しい学校づくり」

## 6. 事業費・財源及びコスト

《事業費》	設計・工事費（契約金額）	3,385,800,000円
《財源》	国庫補助金	約563,000,000円
	（内訳）	
	・ 学校施設環境改善交付金（文科省）	： 約419,000,000円
	・ 公立学校施設整備費負担金（文科省）	： 約144,000,000円

枚方市立禁野小学校新校舎整備事業




禁野小学校新校舎 イメージパース

# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【事業概要】

## ○事業概要

- (事業内容) 旧高陵小学校の校舎を全て解体し、その跡地に禁野小学校の新校舎を建設する。
- (事業手法) 設計施工一括型デザインビルド (DB) 方式
- (工期) 令和4年6月10日～令和8年7月15日  
(令和8年8月供用開始)
- (事業者) 前田組・浦辺設計共同企業体 (JV)
- (事業費) 33億8580万円 (契約金額)
- (国庫補助金) 約5億6300万円

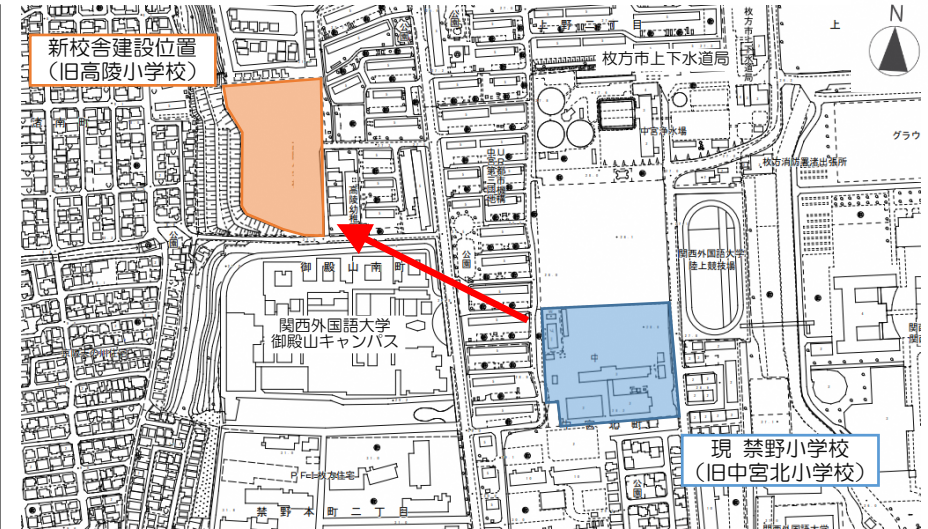

## ○スケジュール等

	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度
設計	6月 基本設計	6月 実施設計			
工事		旧高陵小学校校舎解体工事	6月	新校舎建設工事	7月
文化財調査	試掘	12月	5月	本調査	3月
		8月		※現時点のスケジュールであり、現場状況等により変更となる場合がある。	
年度毎事業費	80,660,000 円	200,915,326 円	621,660,000 円	2,160,051,674 円	322,513,000 円
内国庫補助金	—	—	約 113,000,000 円	約 450,000,000 円	—

## ○関係会議

- 新しい学校づくり協議会 (毎月1回開催) : 両校区コミュニティ会長、禁野小PTA会長、学校長、本市 (教育・施設)、JV
- 関係課会議 (毎月1回開催) : 学校長、本市 (教育・施設)、JV
- 定例会議 (毎月2回開催) : 本市 (施設)、JV

## 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【事業概要】

○新しい学校づくり協議会での主な意見、要望

### 【地域】

- 旧高陵小学校は避難所となる体育館が法面側に配置されていた。新校舎では出来る限り法面から離して欲しい。
- また、法面については、大雨等の影響により崩壊しないよう管理して欲しい。
- 外部から直接出入り出来る地域活動室（コミュニティルーム）を確保して欲しい。
- 十分なスペースを確保した防災備蓄倉庫を設けて欲しい。
- マンホールトイレを設けて欲しい。
- 健全な桜の木は残して欲しい。

### 【学校】

- 可動間仕切を活用することでフレキシブルな会議室等を設けて欲しい。
- 支援教室、通級教室は、学年教室と同じフロアにして欲しい。
- 天の川テラスについては、安全性の観点から手すりを二重にして欲しい。
- 東門からバスや給食車が安全に出入りできるようにして欲しい。

### 【対応】

地域、学校の要望を反映し、基本設計を進めた。

# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【基本設計の概要】


## ○特色

### ●学校施設全体が学びの場

文部科学省「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」(令和4年3月)に基づき、これまで教室と廊下で構成されてきた学校施設の固定概念から脱し、学校施設全体を学びの場として創造する。



教室・廊下・多目的室

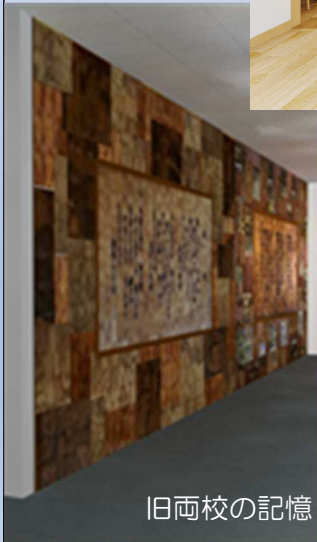


旧両校の記憶



学校図書館

### ●ZEB Ready 達成

高効率設備や高断熱化の導入により、50%以上の省エネを達成することで、脱炭素社会の実現に貢献する。

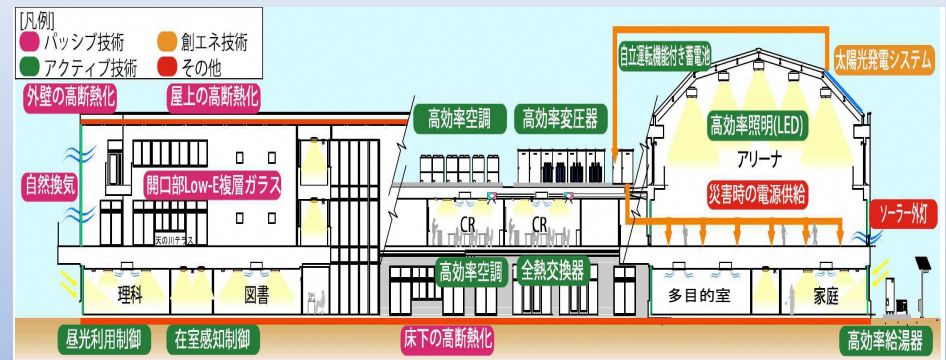

※ZEB Ready：外壁や屋上などの高断熱化、空調やLED照明などの設備機器の高効率化により、従来の標準的な建築物と比べ、エネルギー消費量を50%削減することを目標とする指標。

### ●木材利用

本市友好都市である四万十市産の木材を内装材として効果的に活用することで、温かみのある空間づくりをする。昭和57年に両市の中学生が「青少年友好の森」として植樹したヒノキも活用する。



# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【基本設計の概要】


## ○外観、配置図




① (北) グラウンド側




② (西) のり面側

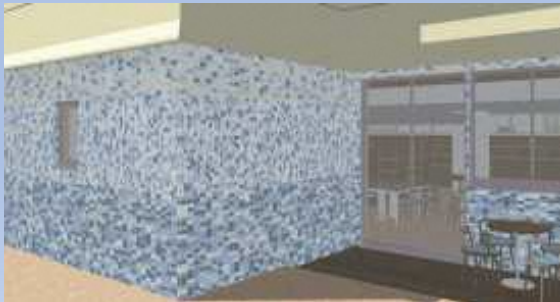

③ 外壁アクセントタイル

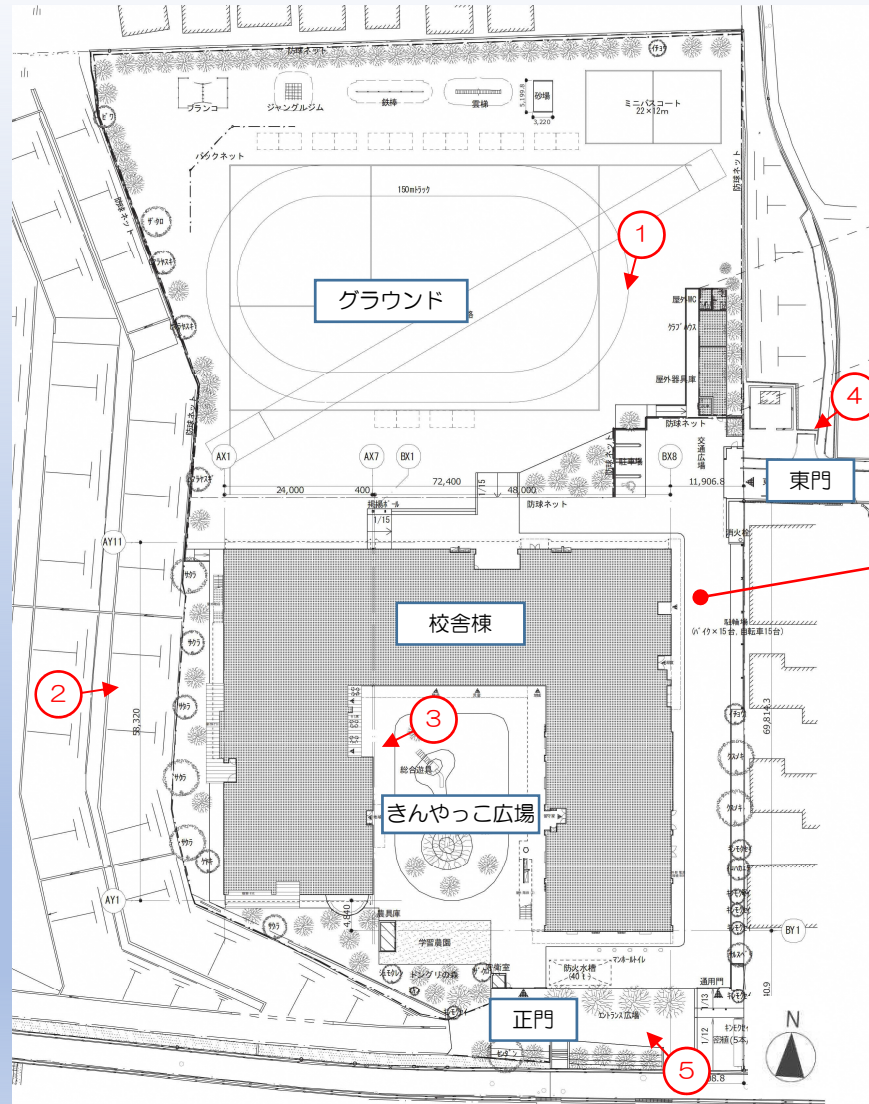

④ (東) 東門側

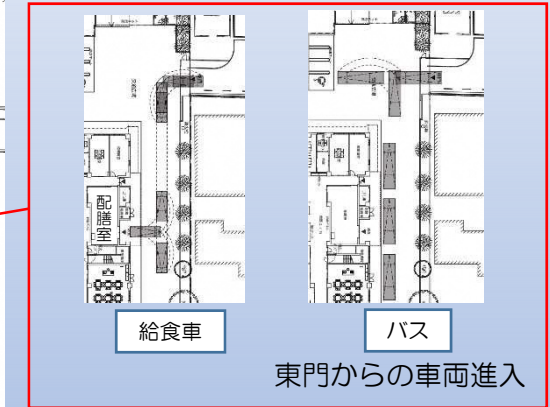


⑤ (南) 正門側

※現時点での基本設計の内容であり、詳細は変更となる場合があります。

# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【基本設計の概要】

## ○1階平面図

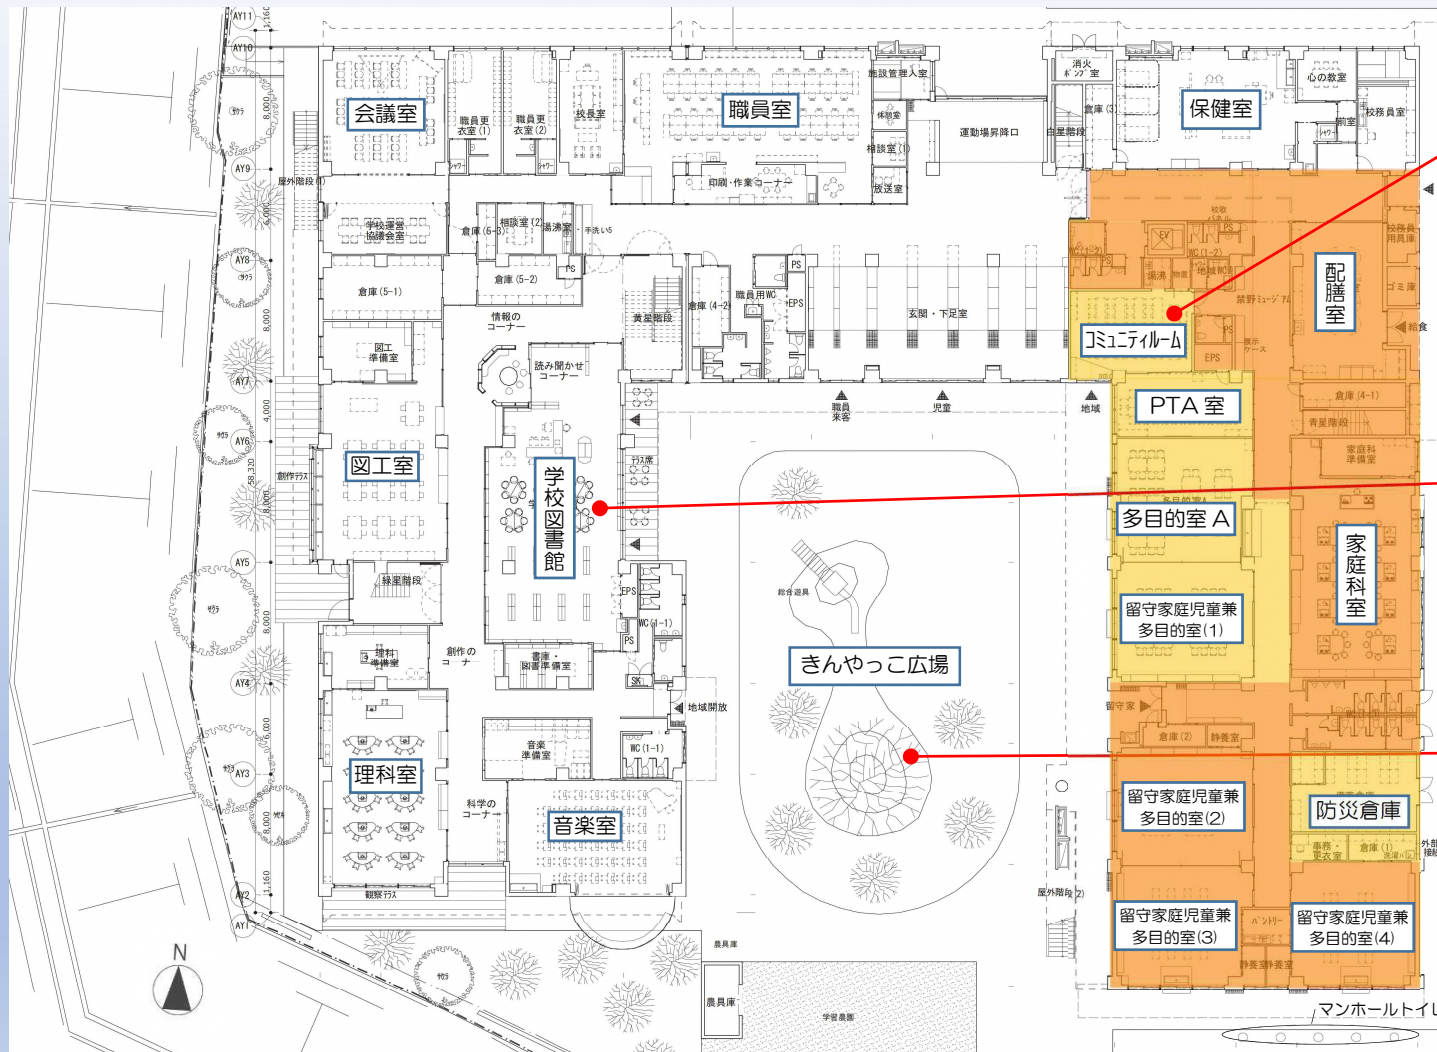


避難所専用エリア (避難所開設時)      学校・避難所兼用エリア (学校再開後)


※現時点での基本設計の内容であり、詳細は変更となる場合があります。

枚方市立禁野小学校新校舎整備事業 【基本設計の概要】

○2階、3階平面図

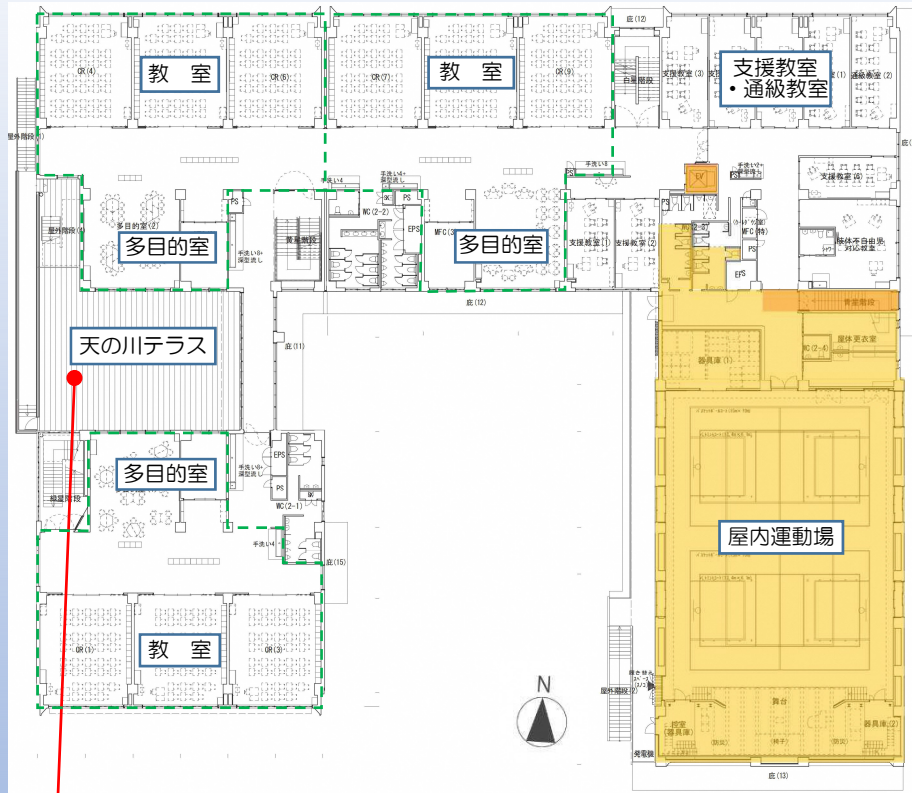

2階平面図

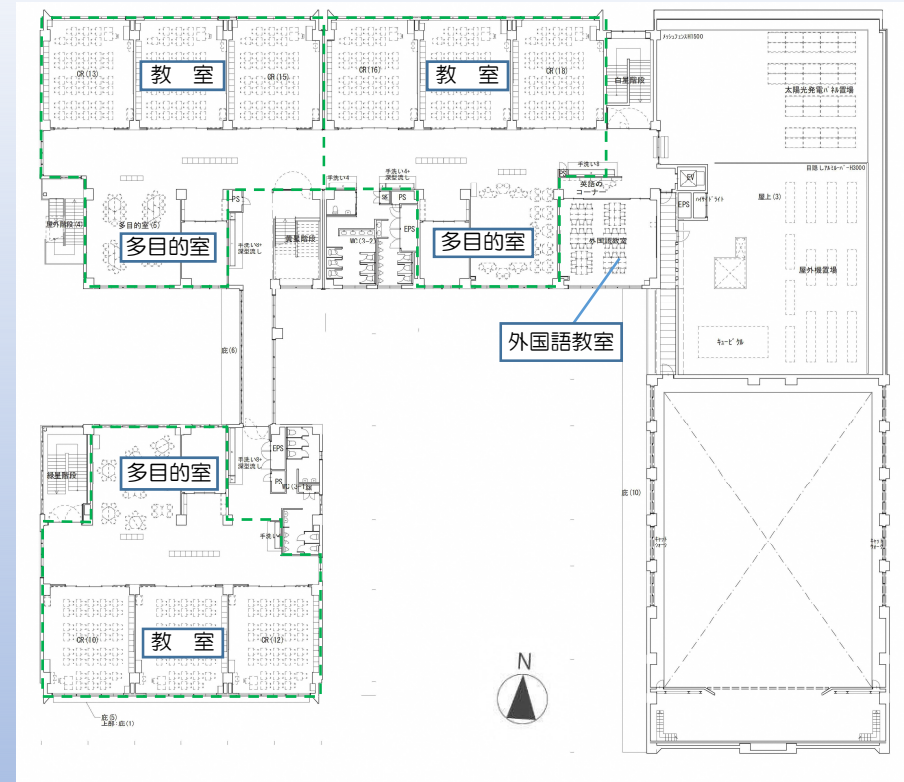

3階平面図



天の川テラス

- 避難所専用エリア (避難所開設時)
- 学校・避難所兼用エリア (学校再開後)
- 学年ユニット

※現時点での基本設計の内容であり、詳細は変更となる場合があります。

# 枚方市立禁野小学校新校舎整備事業

# 【旧高陵小学校校舎の解体状況】

解体工事前



## ■騒音・振動・粉塵対策

(アタッチメントにクラッシャーを採用、散水しながらの破碎作業)



令和5年4月時点



## ■工事用の塀に子供たちの絵を掲示

