

中学校全員給食に向けての整備方針とスケジュールの確定について

1. 内容

中学校給食を食缶方式の全員給食で行うため、令和4年12月に「今後の中学校給食に関する方針」を策定し、必要な検証を行いながら着実に取り組みを進めていくこととしておりました。検証すべき残された課題である、調理場の整備について、今年度において枚方市中学校給食調理場 PFI 導入可能性調査委託により検証し、その結果を踏まえて、調理場の整備手法やスケジュールについて令和5年11月の教育委員会協議会や教育子育て委員協議会等において報告してきたところです。

また、第一学校給食共同調理場の改修期間中は給食の外部発注による対応を想定しておりましたが、昨今の経済動向や社会情勢などを理由に民間事業者から受注できない旨の回答を得ており、改修工事期間中に中学校給食の提供を停止することができないと判断したため第一学校給食共同調理場の改修スケジュールは新たな調理場の整備後に行うものとしします。

これらの内容について、「今後の中学校給食に関する方針」においては可能性調査結果により事業手法やスケジュールの修正が必要となることを示していたことから、今後、食缶方式での中学校全員給食実施を進めるにあたっての、施設整備手法及びスケジュール等の方針を確定するものです。


2. 施設整備手法の方針確定までの経緯について

時期	取組内容	説明
令和3年度 11月から3月	枚方市中学校給食あり方懇話会開催	有識者・PTA・小中学校の校長・栄養教諭から、今後の中学校給食や生徒にとって望ましい給食のあり方への意見聴取
令和4年度 7月	児童・生徒・保護者へのアンケート調査	「中学校給食に関するアンケート調査」において、現在の給食の課題や望ましい学校給食などについて意見聴取
8月	「今後の中学校給食に関する方針(素案)」作成	懇話会やアンケート調査の意見等を踏まえ方針(素案)を作成 【教育子育て委員協議会にて報告】
9月	パブリックコメント実施	本市に在住・在職・在学の人や市内で活動している個人・団体・事業者を対象に、「今後の中学校給食に関する方針(素案)」における意見聴取
10月	「今後の中学校給食に関する方針(案)」作成	方針(素案)におけるパブリックコメントの意見等を踏まえ、方針を策定 【教育委員会にて報告】
11月	「今後の中学校給食に関する方針(案)」の報告	【教育子育て委員協議会にて報告】
12月	「今後の中学校給食に関する方針」策定	【教育委員会にて議決】
	12月補正予算計上：可能性調査委託料	方針の中学校全員給食に向けた実施手法が有効であるか等を検証する調査委託 【12月議会にて議決】
3月	可能性調査委託を契約	【教育委員会にて報告】

令和5年度		方針の手法は有効との結果
10月	可能性調査委託の結果報告	【教育委員会にて報告】
		【庁内委員会にて報告】
		【都市経営会議にて報告】
11月		【教育子育て委員協議会にて報告】

3. 「今後の中学校給食に関する方針」と可能性調査委託の結果について

< 今後の中学校給食に関する方針 >

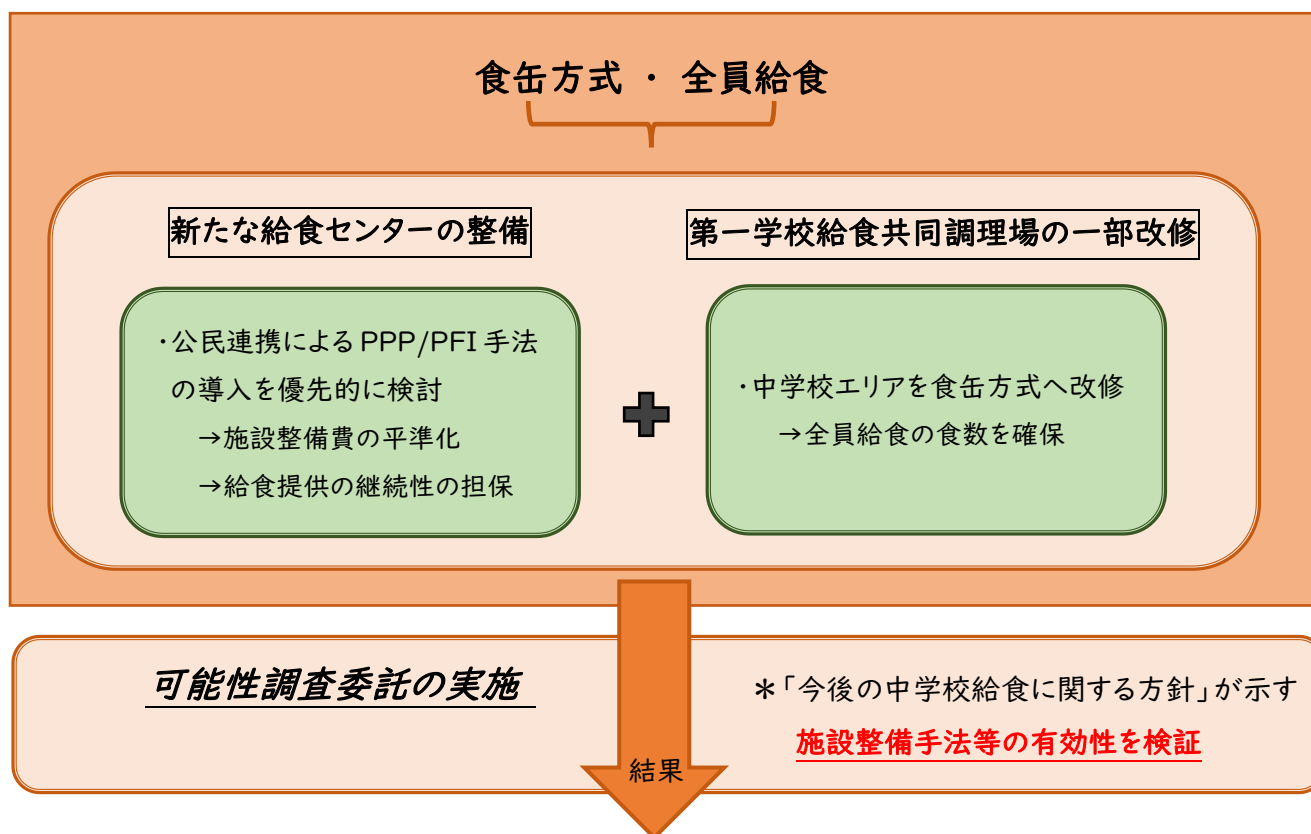

可能性調査では、「今後の中学校給食に関する方針」が示す
「PPP/PFI 手法での新給食センターの整備」及び「第一学校給食共同調理場の中学校
エリア改修」による施設整備手法は「**有効**」との結果となった

4. 全員給食における施設整備方針について

- ・第一学校給食共同調理場 中学校エリア 食缶方式対応のため改修（6,000 食/日）
【整備手法】市発注方式
- ・新給食センターの建築（6,000 食/日）
第三学校給食共同調理場を解体のうえ建替え
【整備手法】PFI 方式(BTO)

5. スケジュール

「今後の中学校給食に関する方針」で示したスケジュールに関して、①PFI 事業による新たな調理場整備におけるアドバイザー委託期間の延長②第一学校給食共同調理場の改修スケジュールの変更により全員給食の開始は、令和10年度とする。

但し、第一学校給食共同調理場の改修中の民間調理場活用における検討の最終期限を令和6年6月とし、活用が可能な場合は、新給食センターの整備と第一学校給食共同調理場の改修を並行して行い、令和9年2学期の開始に変更を行う場合がある。
